

区連会 資料 3-5

9月定例会説明資料
令和7年9月19日
みどり環境局公園緑地事業課

横浜動物の森公園中央道路 開通時期の見通しについて

横浜動物の森公園未整備区域では、中央道路の整備を公園整備の一環として進めています。令和5年度より準備工に着手し、事業を進めております。これまで道路管理者、交通管理者と協議を行ってきた結果、概ね整備内容が定まりましたので、ご報告致します。早期完成を目指して、引き続き事業を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。



1 中央道路整備の概要

(1) 中央道路新設整備区間概要

工事場所 緑区三保町 641 番ほか

延長 新設区間 804m
(整備済区間 1,269m (内、一部公道化済 165m))

道路構造 2車線 (片側1車線) 幅員 17m
(新設区間) 幅員構成：車道 3.0m、自転車通行帯 1.5m、
路肩 0.5m、植栽帯 1.5m、歩道 2.0m

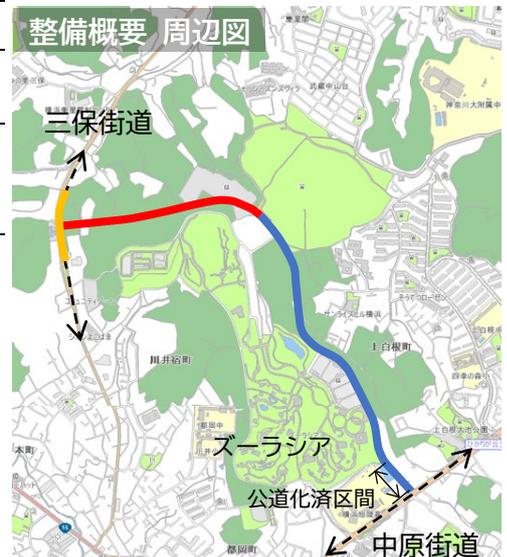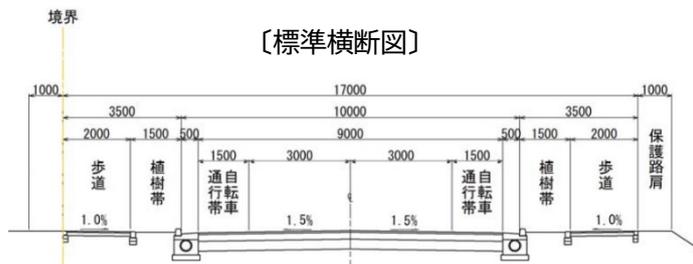

— 新設道路区間：804m
— 整備済道路区間：1,269m
— 三保街道改良区間：202m

(2) 道路整備期間

開通予定時期：令和15年度末

新設区間：令和5年～15年予定

2 整備スケジュール

(1) 準備工：令和5～7年

北門駐車場から搬入路を整備し、道路整備に必要な樹木の伐採・抜根を進めています。

(2) 中央道路工：令和8～13年

樹林地工区((2)-1)を北門駐車場から三保街道側に向け整備を進め、その後、駐車場工区((2)-2)の整備を行います。

最大約20mの切土(擁壁・のり面保護)、約11mの盛土が必要となります。

(3) 橋梁工区：令和12～14年

道路新設により公道が分断されてしまうため、橋(長さ約30m、幅4m)を新たに整備し通行を確保します。

(4) 三保街道改良工区：令和13～15年

新設交差点付近は、交差点における緩勾配を確保するため、既存道路の切下げ(約200m区間)が必要となります。


担当：みどり環境局公園緑地事業課 担当課長 菅谷 浩明

電話：045-671-2684 FAX：045-671-2724


〔整備スケジュール(予定)〕

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
(1)準備工 (搬入路整備、伐採・抜根)		準備工										開 通
(2)中央道路本體工 (2)-1 樹林地工区 (2)-2 駐車場工区				樹林地工区					駐車場工区			
(3)橋梁工								橋梁工区				
(4)三保街道改良工区								三保街道改良工区				

〔平面図〕

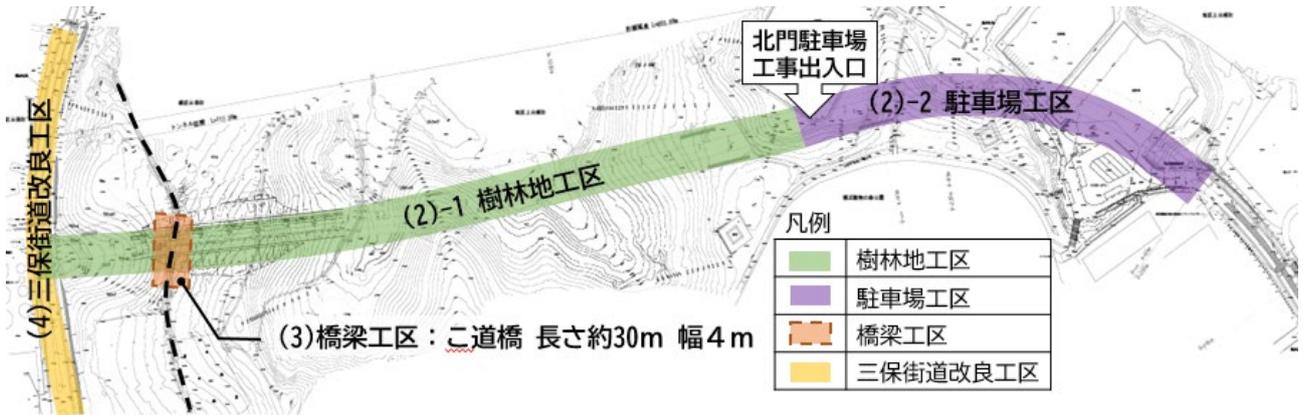

〔縦断図〕 ※高低差を強調した図としています

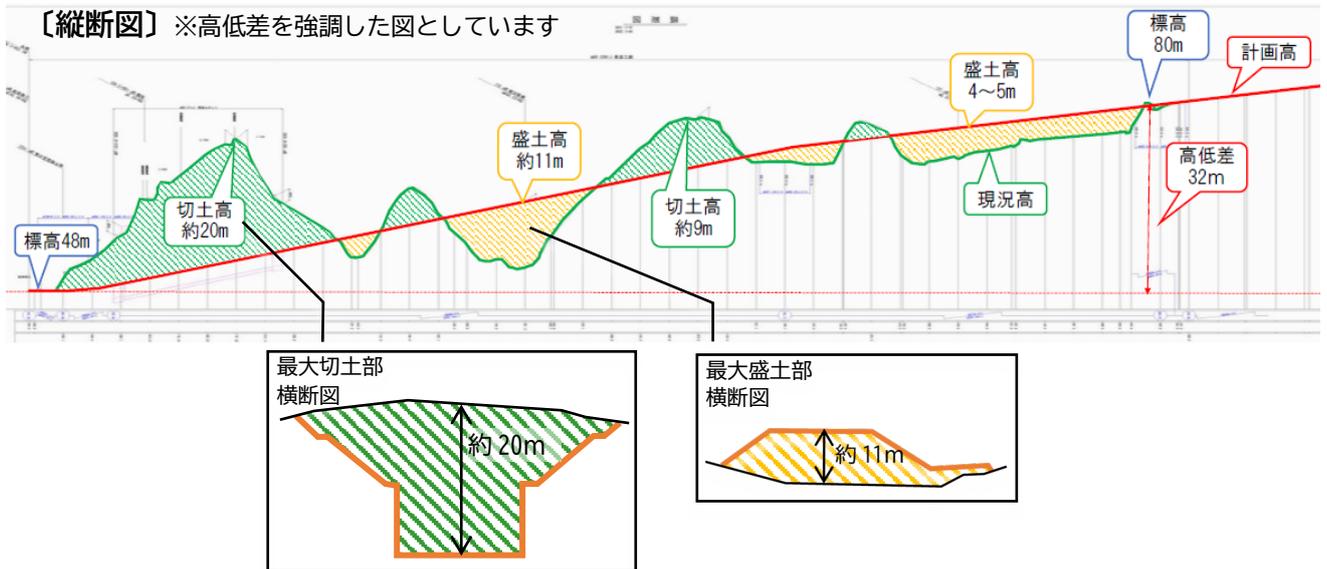

〔三保街道改良工区〕

